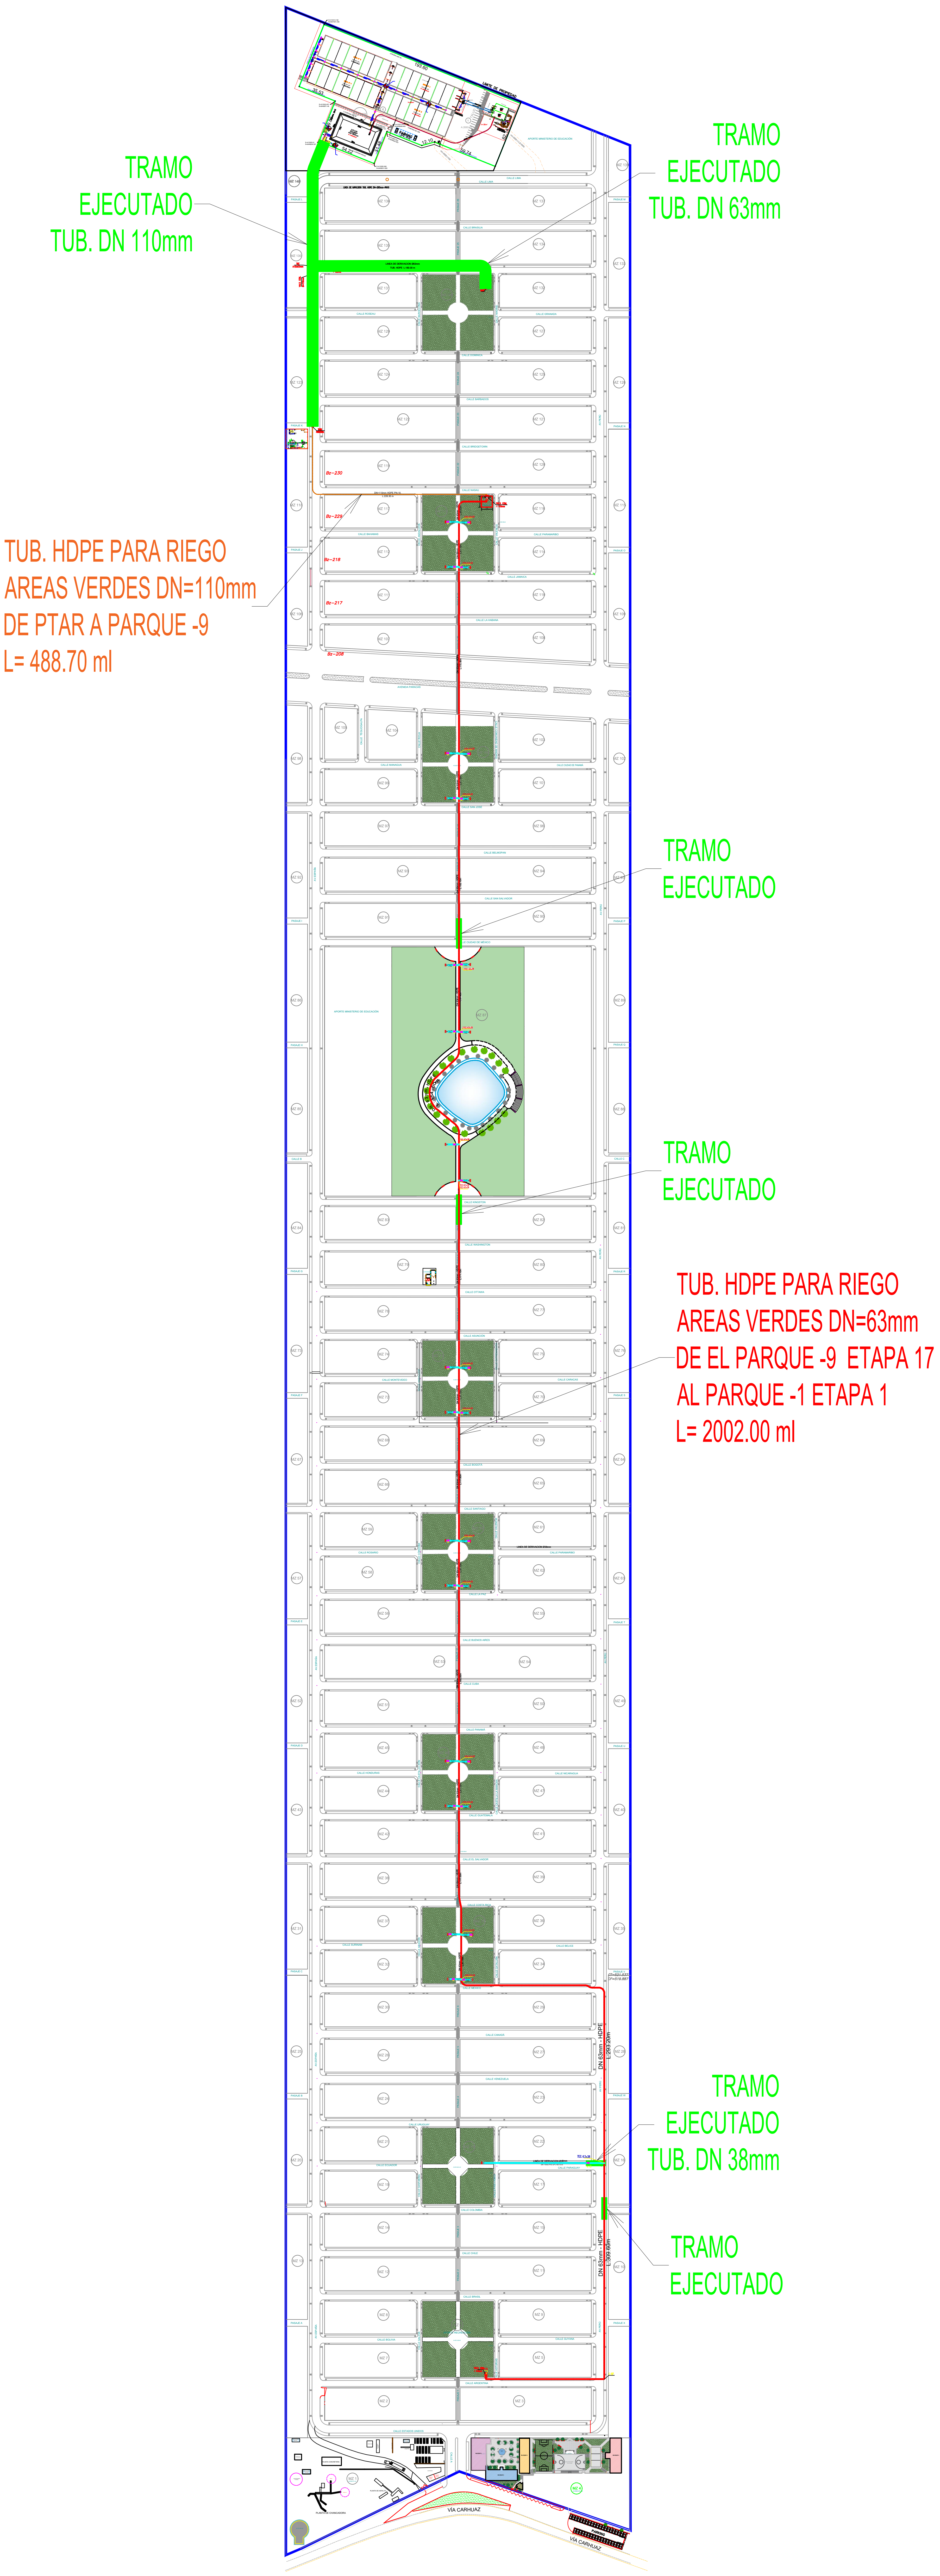
TRAMO
EJECUTADO
TUB. DN 110mm
TRAMO
EJECUTADO
TUB. DN 63mm
TUB. HDPE PARA RIEGO
AREAS VERDES DN=110mm
DE PTAR A PARQUE -9
L= 488.70 ml
TRAMO
EJECUTADO
TRAMO
EJECUTADO
TUB. HDPE PARA RIEGO
AREAS VERDES DN=63mm
DE EL PARQUE -9 ETAPA 17
AL PARQUE -1 ETAPA 1
L= 2002.00 ml
TRAMO
EJECUTADO
TUB. DN 38mm
TRAMO
EJECUTADO
VIA CARHUAZ

TABLA DE METRADOS LINEAS A AREAS VERDES

SIMBOLOS	DESCRIPCION	DIAMETRO	METRADO TOTAL	MET. EJECUTADO	MET. POR EJECUTAR
-·-·-·-	LINEA DE ADUCCION	110mm	478.70 ml	262.40 ml	216.90 ml
——	LINEA DE DERIVACION	63mm	180.00 ml	180.00 ml	0.00 ml
——	LINEA DE IMPULSION	63mm	2002.00 ml	73.75 ml	1928.25 ml
——	LINEA DE DERIVACION	33mm	440.00 ml	18.00 ml	422.00 ml
⊢○⊣	VALV. COMPUERTA	110mm	02 Unds	01 Unds	01 Unds
⊢○⊣	VALV. COMPUERTA	63mm	02 Unds	01 Unds	01 Unds
⊢○⊣	VALV. COMPUERTA	33mm	32 Unds	00 Unds	32 Unds
⊦	TEE	110x63mm	01 Unds	01 Unds	0 Unds
⊦	TEE	63x33mm	32 Unds	00 Unds	32 Unds
